

Руководитель  
регионального проекта —  
Власов Егор Геннадьевич

ОДОБРЕН

---

---

(подпись)



13.01.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

*"(N8-41) Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

---

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Тысяча человек	1.5	0.45	0.91	2.678	14.243	1.8	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О оперативном мониторинге национального проекта экспорта медицинских услуг Ленинградской области" Письмо ГКУЗ ЛО "МИАЦ" от 13.01.2019г. №1-3/5, приложен файл. В связи с необходимостью представления сведений для закрытия отчетного периода за 2019 года по национальному проекту экспорта медицинских услуг в Ленинградской области направляем прогнозный показатель количества иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, в медицинских организациях Ленинградской области за декабрь 2019 года- 14,243 (тыс., чел.).

 Отсутствие отклонений









 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год.	
2		Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг.	
3		Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	
4		Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг. Значение: 1, на дату 01.09.2019</i>	01.09.2019	01.06.2019	Власов Е. Г.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документы выполнения результата" Прочий тип документа от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РПП		Документ разработан	07.07.2019	17.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от г. №, указана ссылка;
1.1.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О функционировании Регионального проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг»	07.07.2019	17.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от г. №, приложен файл;
1.2	РНП		Документ разработан	10.02.2019	10.02.2019	Власов Е. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обращение в службу поддержки по данной ошибке " Иное от г. №, указана ссылка;
1.3	РПП		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	14.07.2019	24.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от г. №, указана ссылка;


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О функционировании Регионального проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг»	14.07.2019	24.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от г. №, приложен файл;
1.4	РПП		Документ утвержден (подписан)	21.07.2019	31.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от 31.05.2019г. №№255-0, указана ссылка;
1.4.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О функционировании Регионального проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг»	21.07.2019	31.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от 31.05.2019г. №№225-0, указана ссылка;
1.5	РПП		Документ опубликован	30.07.2019	31.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от 31.05.2019г. №№255-0, указана ссылка;
1.5.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О функционировании Регионального проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг»	30.07.2019	31.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о создании регионального проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг" Распоряжение от 31.05.2019г. №№225-0, указана ссылка;


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.6	РПП		На базе подведомственного учреждения предусмотрено имущество и финансовое обеспечение созданного Регионального проектного офиса по реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"	01.09.2019	31.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №1-3-174 в КЗ ЛО по имущественному и финансовому обеспечению функционирования РПЛ ЭМУ" ГКУЗ ЛО "МИАЦ" от 01.06.2019г. №№1-3/174, приложен файл. На базе подведомственного учреждения предусмотрено имущество и финансовое обеспечение созданного Регионального проектного офиса по реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - выполнено.
1.6.1			Обеспечение функционирования Регионального проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг	01.09.2019	01.06.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №1-3-174 в КЗ ЛО по имущественному и финансовому обеспечению функционирования РПЛ ЭМУ" ГКУЗ ЛО "МИАЦ" от 01.06.2019г. №№1-3/174, приложен файл. На базе подведомственного учреждения предусмотрено имущество и финансовое обеспечение созданного Регионального проектного офиса по реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - выполнено.
2			<i>Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам Значение: 1, на дату 06.06.2019</i>	06.06.2019	28.05.2019	Власов Е. Г.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документы по исполнению результата" Прочий тип документа от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
2.1	РПП		Документ разработан	15.05.2019	15.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от г. №, указана ссылка;


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам»	15.05.2019	15.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от г. №, приложен файл;
2.2			Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	20.05.2019	20.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от г. №, указана ссылка;
2.2.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам»	20.05.2019	20.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от г. №, приложен файл;
2.3			Документ утвержден (подписан)	02.06.2019	28.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от 28.05.2019г. №№220-0, указана ссылка;
2.3.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам»	02.06.2019	28.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от 28.05.2019г. №№220-о, приложен файл;


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.4	РРП		Документ опубликован	06.06.2019	28.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от 28.05.2019г. №№220-0, указана ссылка;
2.4.1			Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области «О системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам»	06.06.2019	28.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Распоряжение от г. №, приложен файл;
3			<i>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам Значение: 1, на дату 01.07.2019</i>	01.07.2019	01.07.2019	Власов Е. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Документы по исполнению результат" Прочий тип документа от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
3.1	РРП		Медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранения Ленинградской области располагают статистическими отчетными формами и инструкциями по их заполнению	12.06.2019	29.05.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в МО, подведомственные по КЗЛО, по обеспечению статистическими отчетными формами и инструкциями." Письмо от 29.05.2019г. №№3-2/108, указана ссылка;

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены










Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1			Медицинским организациям, подведомственным Комитету по здравоохранению Ленинградской области переданы статистические отчетные формы и инструкции по их заполнению	12.06.2019	29.05.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо руководителям медицинских организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению ЛО о мониторинге статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Письмо от 29.05.2019г. №№3-2/108, приложен файл; 2. "Пр.1 Ежемес.монит.стат.данн.мо.по объему ок.мед. усл.инстр.гражд" Иное от г. №, приложен файл; 3. "Пр.2 (исполнители)" Иное от г. №, приложен файл;
3.2	РПП		ГКУЗ ЛО «МИАЦ» принимает предварительные отчеты медицинских организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области по мониторингу статистических данных	24.06.2019	24.06.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный файл предоставления отчетности" Иное от г. №, указана ссылка;
3.2.1			Медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранению Ленинградской области и ГКУЗ ЛО «МИАЦ» проводят работы по внедрению системы мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	24.06.2019	24.06.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный файл сдачи отчетности" Иное от г. №, приложен файл;
3.3	РПП		ГКУЗ ЛО «МИАЦ» проводит методическую работу с медицинскими организациями, подведомственными Комитету по здравоохранению Ленинградской области по формированию статистической отчетности	01.07.2019	01.07.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо запрос КЗЛО о готовности к приему иностранных граждан по ЭМУ" Письмо от г. №, указана ссылка;


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.1			Медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранению Ленинградской области и ГКУЗ ЛО «МИАЦ» проводят работы по внедрению системы мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	01.07.2019	01.07.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Инструкция по заполнению - Письмо- запрос КЗЛО о готовности к приему иностр по ЭМУ" Письмо от г. №, приложен файл;
4			<i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год. Значение: 1, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Власов Е. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Документы по исполнению результата" Прочий тип документа от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
4.1	РПП		Разработан дизайн-проект сайта	01.08.2019	17.07.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта КЗ ЛО" от г. №, приложен файл. Разработан дизайн-проект раздела сайта КЗ ЛО - выполнено
4.1.1			Создание раздела сайта Комитета по здравоохранению Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	01.08.2019	18.07.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект сайта КЗ ЛО" от г. №, приложен файл. Разработан дизайн-проект сайта - выполнено
4.2	РПП		Разработан дизайн-проект сайта	01.08.2019	19.07.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта МИАЦ ЛО" от г. №, приложен файл. Разработан дизайн-проект раздела сайта КЗ ЛО - выполнено


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2.1			Создание и развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и сайтов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	01.08.2019	19.07.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект сайта МИАЦ ЛО" от г. №, приложен файл. Разработан дизайн-проект сайта - выполнено
4.3	РПП		Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями	15.08.2019	25.07.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта КЗ ЛО" от г. №, приложен файл. Согласование дизайн-проекта раздела сайта КЗ ЛО с заинтересованными органами и организациями - выполнено
4.3.1			Создание раздела сайта Комитета по здравоохранению Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	15.08.2019	25.07.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта КЗ ЛО" от г. №, приложен файл. Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями - выполнено
4.4	РПП		Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями	15.08.2019	26.07.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта МИАЦ ЛО" от г. №, приложен файл. Согласование дизайн-проекта раздела сайта МИАЦ ЛО с заинтересованными органами и организациями - выполнено
4.4.1			Создание и развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и сайтов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	15.08.2019	26.07.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект сайта МИАЦ ЛО" от г. №, приложен файл. Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями - выполнено


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.5	РПП		Утвержден (подписан) дизайн-проект сайта	23.08.2019	01.08.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта КЗ ЛО, посвященный проекту "Развитие экспорта медицинских услуг" в ЛО" Комитет по здравоохранению Ленинградской области от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл. Утвержден (подписан) дизайн-проект раздела сайта КЗ ЛО, посвященный проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» в Ленинградской области - выполнено
4.5.1			Создание раздела сайта Комитета по здравоохранению Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	23.08.2019	01.08.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект КЗ ЛО" Комитет по здравоохранению Ленинградской области от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл. Утвержден (подписан) дизайн-проект раздела сайта - выполнено
4.6	РПП		Утвержден (подписан) дизайн-проект сайта	23.08.2019	01.08.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн-проект раздела сайта МИАЦ ЛО, посвященный проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» в Ленинградской области - выполнено" Комитет по здравоохранению Ленинградской области от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл. Утвержден (подписан) дизайн-проект раздела сайта МИАЦ ЛО, посвященный проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» в Ленинградской области - выполнено
4.6.1			Создание и развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и сайтов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	23.08.2019	01.08.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дизайн проект раздела сайта МИАЦ ЛО" Комитет по здравоохранению Ленинградской области от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл. Утвержден (подписан) дизайн-проект раздела сайта - выполнено


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.7	РПП		Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом	01.10.2019	27.09.2019	Рябуха Е. А.	-
4.7.1			Создание раздела сайта Комитета по здравоохранению Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	01.10.2019	27.09.2019	Закарян А. А.	-
4.8	РПП		Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом	01.10.2019	27.09.2019	Рябуха Е. А.	-
4.8.1			Создание и развитие раздела сайта ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и сайтов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области, посвященного проекту, «Развитие экспорта медицинских услуг»	01.10.2019	27.09.2019	Закарян А. А.	-
4.9	РПП		Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте	31.12.2019	29.11.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел сайта Комитета по здравоохранению Ленинградской области, посвященный региональному проекту Ленинградской области "Развитие экспорта медицинских услуг "" Ссылка от г. №, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.9.1			Размещение на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	31.12.2019	29.11.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел сайта Комитета по здравоохранению Ленинградской области, посвященный региональному проекту Ленинградской области "Развитие экспорта медицинских услуг "" Ссылка от г. №, указана ссылка.
4.10	РРП		Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте	31.12.2019	29.11.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел сайта ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр", посвященный региональному проекту Ленинградской области "Развитие экспорта медицинских услуг"" Ссылка от г. №, указана ссылка.
4.10.1			Размещение на официальном сайте ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и сайтов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	31.12.2019	29.11.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел сайта ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр", посвященный региональному проекту Ленинградской области "Развитие экспорта медицинских услуг "" Ссылка от г. №, указана ссылка.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.11	РРП		Информирование граждан о перечне медицинских организаций, их структурных подразделений, специалистов, предоставляемых медицинских услуг	31.12.2019	29.11.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Выборгский роддом"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 2. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 3. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "ДКБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 4. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 5. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 6. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 7. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 8. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ "ЛОКБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 9. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ "ЛОКОД"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 10. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 11. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.11.1			Информирование граждан о перечне медицинских организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области их структурных подразделений, специалистов, предоставляемых медицинских услуг в рамках реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	31.12.2019	29.11.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Выборгский роддом"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 2. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 3. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "ДКБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 4. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 5. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 6. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 7. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 8. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ "ЛОКБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 9. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ "ЛОКОД"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 10. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка. 11. "Раздел сайта, посвященный ЭМУ ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"" Ссылка от г. №, указана ссылка.
4.12	РРП		Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ	31.12.2019	31.12.2019	Рябуха Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2019 (с января по декабрь 2019 года)" Отчет об исполнении бюджета от г. №, приложен файл.
4.12.1			Направление информационных справок о ходе реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ	31.12.2019	31.12.2019	Закарян А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты за 2019 год (январь-декабрь 2019)" Отчет об исполнении бюджета от г. №, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



## Динамика достижения контрольных точек

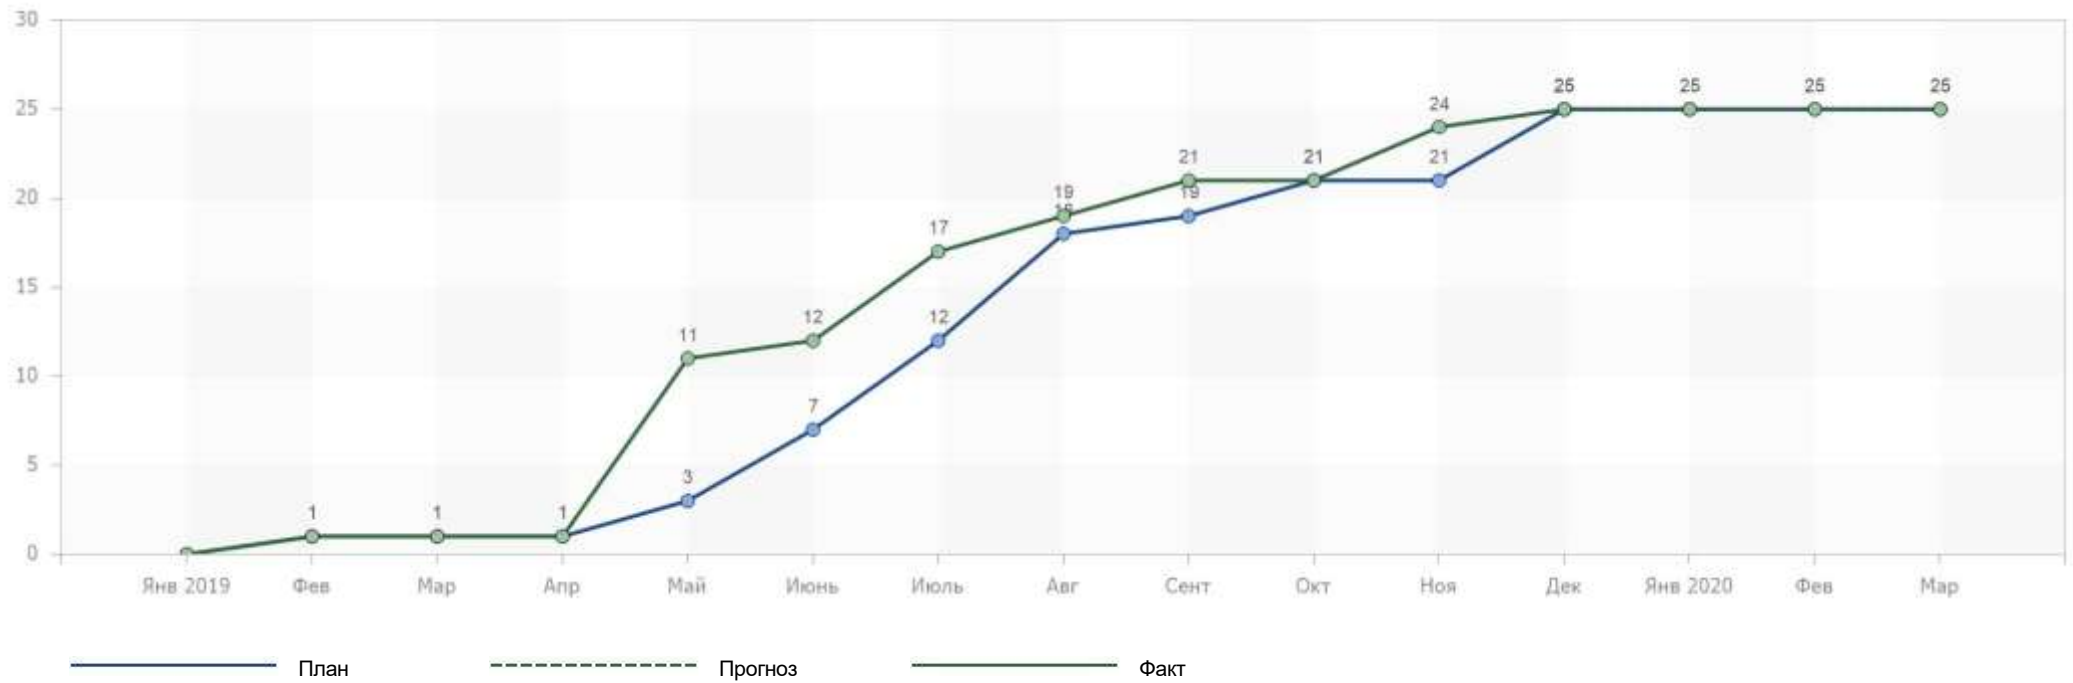


Рис. 1. "(N8-41) Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)"

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

График достижения показателя

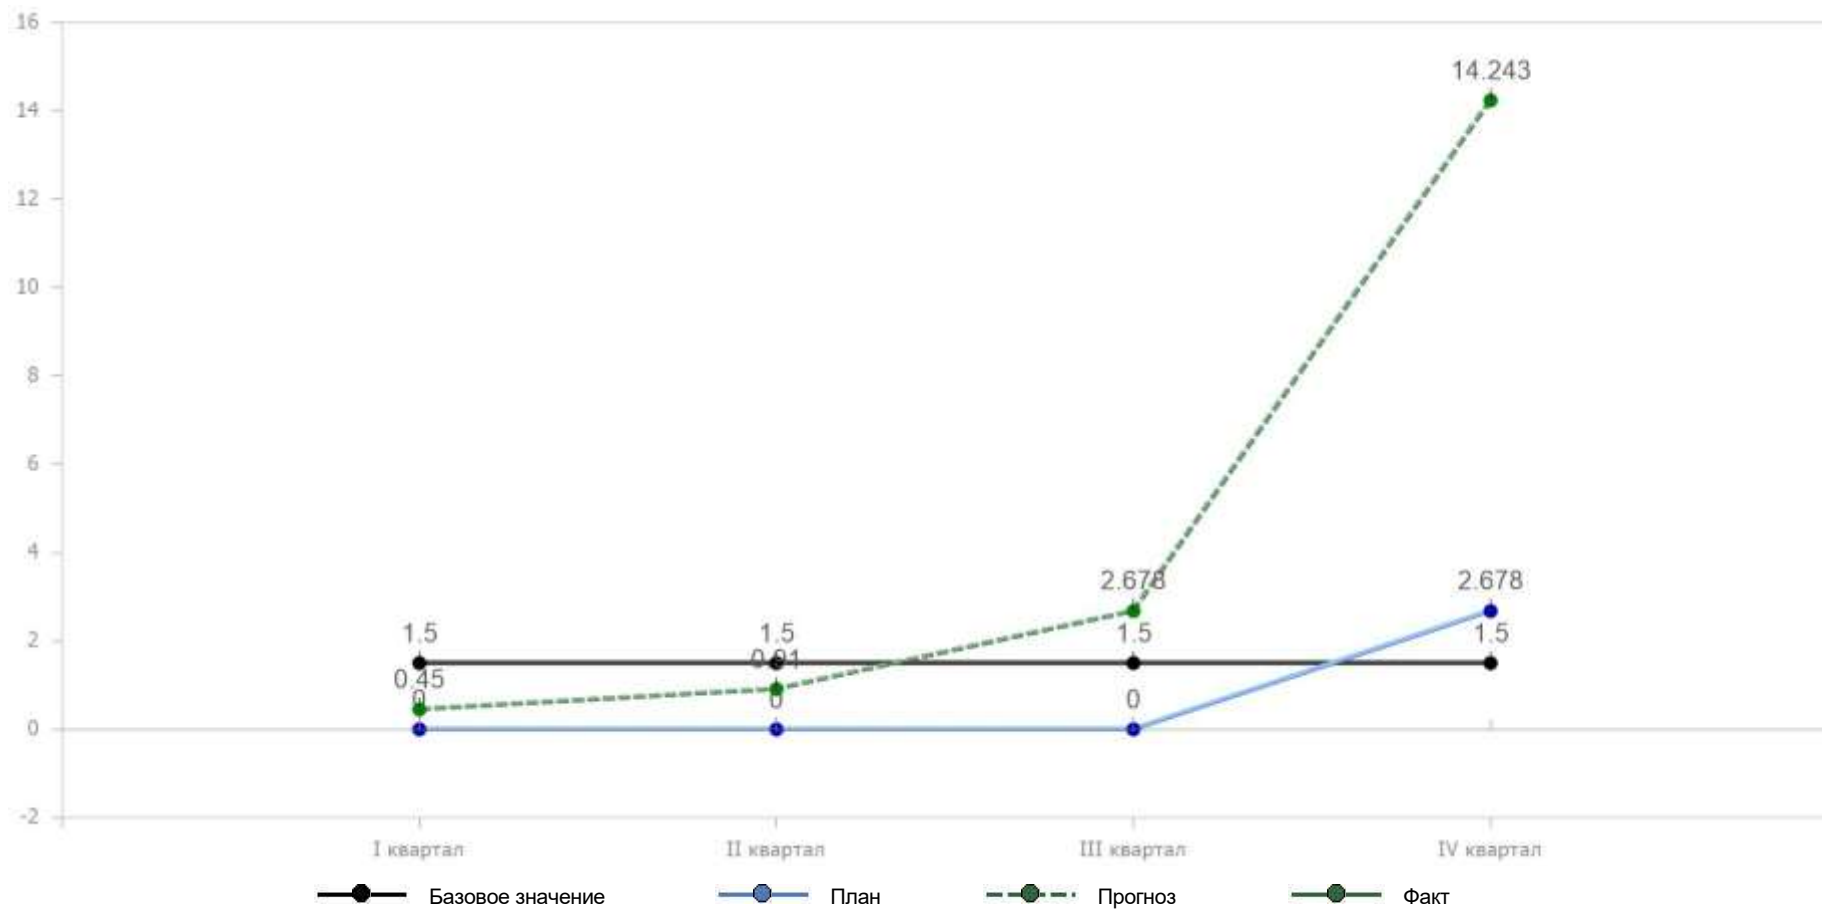


Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Диаграмма достижения показателя

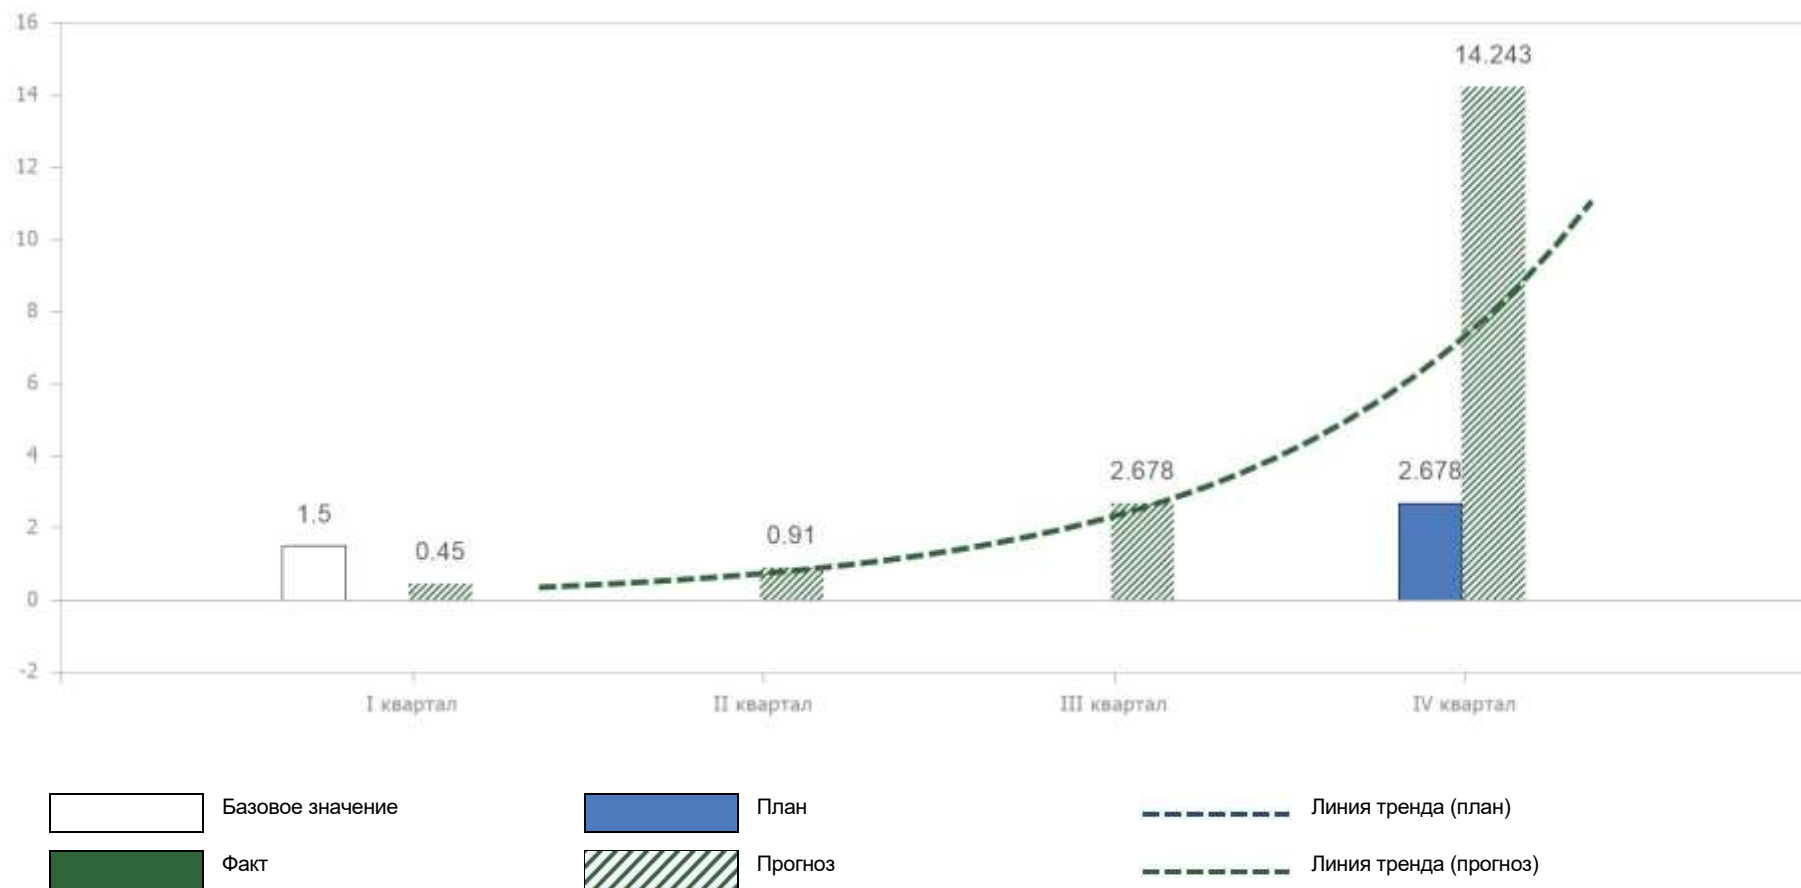


Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
